




Gemeinde

Freienwil

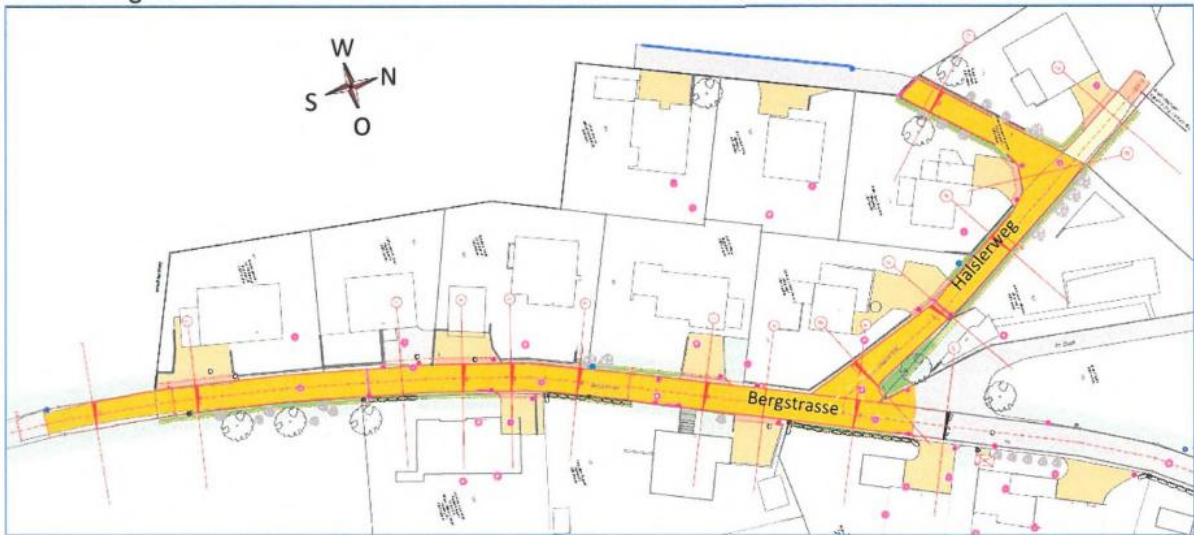

Projektperimeter obere Bergstrasse / Hälslerweg

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Sanierung obere Bergstrasse / Hälslerweg INV 83

CHF 900'000 Einwohnergemeindeversammlung Freienwil 29. Juni 2023

Einwohnergemeindeversammlung

25. Juni 2026

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 900'000.00					
Objekt	Verpflichtungskredit Sanierung obere Bergstrasse / Hälslerweg INV 83					
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2023					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.16			CHF	120'626.50	
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7101.5030.16			CHF	204'860.67	
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7201.5030.16			CHF	380'593.49	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern (7101 und 7201)				CHF	47'076.54	
Total Bruttoanlagekosten				CHF	753'157.20	
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit				CHF	900'000.00	
Kreditunterschreitung				CHF	-146'842.80	
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				CHF	-	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				CHF	-	
abzüglich Vorsteuerkürzung				CHF	-	
Total Einnahmen				CHF	-	
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF	706'080.66	
Total Einnahmen				CHF	-	
Nettoinvestition				CHF	706'080.66	
5 Aktivierung (falls relevant)						
Übertrag von Konto		Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
14070.10	Strasse	ANL00192	14010.01	6150.3300.10	CHF 120'626.50	
14071.30	Wasser	ANL00193	14031.01	7101.3300.31	CHF 204'860.67	
14072.30	Abwasser	ANL00194	14032.01	7201.3300.31	CHF 380'593.49	
Total der Nettoinvestition:				CHF	706'080.66	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					CHF	-
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.						
Beim Strassenbau waren nur Minderkosten von rund CHF 4'000 zu verzeichnen.						
Der Leitungsersatz beim Wasser an der Bergstrasse war 9 m kürzer und ein Schieberkombination weniger sowie andere kleinere Arbeiten ergaben gegenüber dem Kostenvoranschlag Minderkosten von rund CHF 45'000.						
Die grösste Kreditunterschreitung kam beim Abwasserbau zustande. Aufgrund der koordinierten Ausführungen konnten die Arbeiten sehr preiswert vergeben werden. Kreditunterschreitung rund CHF 100'000.						
Zudem fielen beim gesamten Projekt keine zusätzlichen Arbeiten an. Dadurch wurde die Reserve beim Verpflichtungskredit nicht benötigt.						
